

INFRAESTRUCTURA REGIONAL LA PAZ
CAJA NACIONAL DE SALUD

ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION



SITUACIÓN ACTUAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022

1. REFAC. Y REMODELACIÓN INTEGRAL HOSPITAL OBRERO N° 1 LA PAZ

1.1.

REMODELACION UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA HOSPITAL OBRERO N°1

SUPERVISION REMODELACION UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA HOSPITAL OBRERO N°1

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PAGOS REALIZADOS	SALDOS POR PAGAR
26,42%	35,00%	OBRA: BS. 260.095,25	OBRA: BS. 701.907,40
		SUP: BS. 5.931,54	SUP: BS. 39.038,46

ESTADO: A solicitud de la unidad solicitante se hicieron modificaciones al diseño del proyecto, la empresa realizo el balance para el contrato modificadorio n°1 el cual se ara la revisión correspondiente hasta el martes 01/11/22.



SITUACIÓN ACTUAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022

1. REFAC. Y REMODELACIÓN INTEGRAL HOSPITAL OBRERO N° 1 LA PAZ

1.2.

AMPLIACION GASES MEDICOS UTI HOSPITAL OBRERO N°1 – LA PAZ

SUPERVISION AMPLIACION GASES MEDICOS UTI HOSPITAL OBRERO N°1 – LA PAZ

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PAGOS REALIZADOS	SALDOS POR PAGAR
33,16%	60,00 %	OBRA: BS. 322.688,61 SUP: BS. 14.589,53	OBRA: BS. 650.495,32 SUP: BS. 29.410,47

ESTADO: Se encuentra en ejecución la obra se ingreso la siguiente planilla de pago hasta el 26/10/2022 el cual se encuentra en revisión por fiscalización y se emitirá una respuesta hasta el 01/11/2022.



SITUACIÓN ACTUAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022

1. REFAC. Y REMODELACIÓN INTEGRAL HOSPITAL OBRERO N° 1 LA PAZ


1.3.

CONSTRUCCION SALA DE MAQUINAS PISO 2 HOSPITAL OBRERO N1 - LA PAZ

SUPERVISION CONSTRUCCION SALA DE MAQUINAS PISO 2 HOSPITAL OBRERO N1 - LA PAZ

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PAGOS REALIZADOS	SALDOS POR PAGAR
25,00%	11,34%	OBRA: BS. 113.038,89	OBRA: BS. 701.907,40
		SUP: BS. 4.989,60	SUP: BS. 39.038,46

ESTADO: Se realizaron modificaciones al proyecto a solicitud de la unidad solicitante actualmente la empresa se encuentra realizando el balance para el Contrato Modificadorio N°1 el cual será ingresada a la Unidad de Infraestructura para revisión de fiscalización hasta el 31/10/2022.

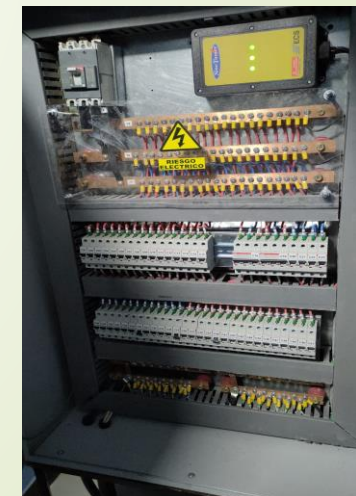

SITUACIÓN ACTUAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022

1. REFAC. Y REMODELACIÓN INTEGRAL HOSPITAL OBRERO N° 1 LA PAZ

1.4.

IMPLEMENTACION CENTRAL DE AIRE MEDICINAL HOSPITAL OBRERO N°1 LA PAZ

SUPERVISION IMPLEMENTACION CENTRAL DE AIRE MEDICINAL HOSPITAL OBRERO N°1 LA PAZ

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PAGOS REALIZADOS	SALDOS POR PAGAR
47,03%	50,00 %	OBRA: BS. 480.480,94	OBRA: BS. 519.267,45
		SUP: BS. 10.813,83	SUP: BS. 34.186,17

ESTADO: La empresa se encuentra a la espera de la liberación del área a emplazar se tiene programado continuar con la obra previa coordinación el lunes 31/10/2022.



SITUACIÓN ACTUAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022

1. REFAC. Y REMODELACIÓN INTEGRAL HOSPITAL OBRERO N° 1 LA PAZ

1.5.

IMPLEMENTACION CENTRAL DE VACIO MEDICO HOSPITALARIO HOSPITAL OBRERO N°1 LA PAZ

SUPERVISION IMPLEMENTACION CENTRAL DE VACIO MEDICO HOSPITALARIO HOSPITAL OBRERO N°1 LA PAZ

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PAGOS REALIZADOS	SALDOS POR PAGAR
48,28%	50,00 %	OBRA: BS. 480.480,94 SUP: BS. 10.813,83	OBRA: BS. 519.267,45 SUP: BS. 34.186,17

ESTADO: La empresa se encuentra a la espera de la liberación del área a emplazar se tiene programado continuar con la obra previa coordinación el lunes 31/10/2022.



1. REFAC. Y REMODELACIÓN INTEGRAL HOSPITAL OBRERO N° 1 LA PAZ

1.6.

CONSTRUCCION CASETA Y ACOMETIDA ELECTRICA SISTEMA DE GASES MEDICINALES HOSPITAL OBRERO N°1 LA PAZ

SUPERVISION CONSTRUCCION CASETA Y ACOMETIDA ELECTRICA SISTEMA DE GASES MEDICINALES HOSPITAL OBRERO N°1 LA PAZ

Estado: Se cuenta con la resolución de adjudicación de la empresa por Bs.975.824,27 y la supervisión cuenta con contrato suscrito N° 120/2022 del 17/06/2022 por bs.45.000,00.

Actualmente el contrato de la empresa se encuentra observada debido a que gerencia general esta revisando los módulos del obrero, para el cual se emitió la nota 1513/2022 de fecha 17/10/2022 a administración solicitando que se viabilice el proyecto, en respuesta se emitió la nota admr-n-1759/2022 con ref. suyo nota cite 1513/2022 informando que se encuentra a la espera de la respuesta a la consulta efectuada por el ex administrador regional la paz (anexo 2).

Es esencial la ejecución de este proyecto debido a que realizara la readecuación de la caseta donde se instalara los transformadores del Hospital Obrero N°1, realizara la construcción de la plataforma para equipos de renovación de aire y la instalación del alimentador principal para los equipos de gases medicinales y vacío.

MONTO DEL PROYECTO

Bs. 975.824,27

MONTO DE SUPERVISION

Bs. 45.000,00

1. REFAC. Y REMODELACIÓN INTEGRAL HOSPITAL OBRERO N° 1 LA PAZ

1.7.

CAMBIO DE TRANSFORMADORES DE MEDIA TENSION HOSPITAL OBRERO N°1 LA PAZ

SUPERVISION CAMBIO DE TRANSFORMADORES DE MEDIA TENSION HOSPITAL OBRERO N°1 LA PAZ

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PAGOS REALIZADOS	SALDOS POR PAGAR
12,78%	30,70%	OBRA: BS. 127.697,27	OBRA: BS. 871.771,58
		SUP: BS. 5.751,00	SUP: BS. 39.249,00

ESTADO: Los transformadores contaminados fueron retirados y se instalaron transformadores provisionales hasta la llegada de los nuevos estimado para el fin de año, se esta realizando la aprobación de planos de la caseta por DELAPAZ, el cual tiene modificaciones motivo por el cual la empresa presento el contrato modificadorio N°1 el cual fue revisado y aprobado por supervisión y fiscalización posteriormente se remitió la solicitud al administrador regional la paz el 17/10/2022. Actualmente se encuentra en asesoría legal.



1. REFAC. Y REMODELACIÓN INTEGRAL HOSPITAL OBRERO N° 1 LA PAZ

1.8.

ADQUISICION EQUIPO – HEMODINAMIA HAIG OBRERO N°1 – LA PAZ

Estado: El monto referencial es de Bs.21.000.000,00 el cual fue licitado por la nacional y debido a observaciones se hizo la anulación actualmente tiene la resolución de anulación RPC N° ALC/060/2022 de fecha 19/10/2022 (anexo 4), motivo por el cual se encuentra a la espera de una nueva publicación

MONTO DEL PROYECTO

Bs. 21.000.000,00

1. REFAC. Y REMODELACIÓN INTEGRAL HOSPITAL OBRERO N° 1 LA PAZ

1.9.

REFACCION UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL HAIG OBRERO N°1 – LA PAZ

SUPERVISION REFACCION UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL HAIG OBRERO N°1 – LA PAZ

Estado: EL monto referencial de los trabajos complementarios en infraestructura es de Bs.1.000.000,00, una vez firmado el contrato de la instalación del equipo de hemodinamia se coordinara con la empresa adjudicada y la unidad solicitante para realizar los trabajos complementarios.

MONTO DEL PROYECTO

Bs. 1.000.000,00

2. IMPLM. RED DE GAS NATURAL Y CALEFACCION CENTRALIZADA HOSPITAL L.U.O.

LA PAZ.

2.1.

IMPLEMENTACION DE RED DE GAS NATURAL Y CALEFACCION CENTRALIZADA - HIES LUO

SUPERVISION MPLEMENTACION DE RED DE GAS NATURAL Y CALEFACCION CENTRALIZADA - HIES LUO

ESTADO: Se remite mediante cite 1173 de fecha 26/08/2022 (anexo 5), al departamento nacional infraestructura de salud solicitando se gestione el inicio de proceso de contratación de la obra modalidad licitación publica con un monto referencial de Bs. 2,949,164,71

del seguimiento realizado el jefe del departamento nacional de compras Ing. Cristian Villegas remite la nota 2406/2022 al gerente general con Ref.: remisión de proyecto de resolución administrativa de designación de RPC.

De la SUPERVISION se remitió la carpeta para dar inicio al proceso de contratación mediante cite 1384/2022 de fecha 28/09/2022 (anexo 6) a la unidad de compras de la regional.

MONTO DEL PROYECTO

Bs. 2,949,164,71

MONTO DE SUPERVISION

Bs. 132,712,41

2, HOSPITAL L.U.O. LA PAZ.

2,2.

IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE NUTRICION – HOSPITAL LUIS URIA DE LA OLIVA - REGIONAL LA PAZ

SUPERVISION MPLEMENTACION DE RED DE GAS NATURAL Y CALEFACCION CENTRALIZADA - HIES LUO

ESTADO: Se remite mediante cite 1286 de fecha 15/09/2022 (Anexo 7), al departamento nacional de infraestructura de salud de la caja nacional de salud para dar curso al inicio del proceso de contratación para la ejecución de la obra modalidad licitación pública con un monto referencial de Bs. 3,080,381,00

El DNIS hizo observaciones a la carpeta las cuales fueron subsanadas para su licitación, actualmente la carpeta esta en el departamento nacional de compras de la CNS.

La Unidad de Compras hizo observaciones a la carpeta, actualmente se encuentra corrigiendo el Departamento Nacional De Infraestructura conjuntamente con La Unidad de Infraestructura Regional La Paz.

El 04/10/2022 con Cite:1423/2022 (Anexo 8) se remite para su publicación a la unidad de compras de la regional la carpeta del proceso de contratación de la supervisión en modalidad ANPE con monto referencial de Bs.138.617,15.

MONTO DEL PROYECTO

Bs. 3,080,381,00

MONTO DE SUPERVISION

Bs. 138,617,15

2. IMPLM. AREA DE RESIDENCIA MEDICA L.U.O. LA PAZ.

2.3

CONSTRUCCIÓN AREA DE RESIDENTES HIES LUIS URIA DE LA OLIVA

SUPERVISION CONSTRUCCIÓN AREA DE RESIDENTES HIES LUIS URIA DE LA OLIVA

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PAGOS REALIZADOS	SALDOS POR PAGAR
98,57%	100,00%	OBRA: BS. 998.187,04 SUP: BS. 29.365,59	OBRA: BS. 0,00 SUP: BS. 14.926,41

ESTADO: LA planilla N°3 de supervisión se aprobó y la Planilla N°4 de supervisión será remitida a la unidad de infraestructura el 28/10/2022 el cual será revisada dentro de los 5 días calendario posteriores.



3. EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA PEDIATRICA EN EL HODE MATERNO INFANTIL LA PAZ

3.1.

EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA PEDIATRICA EN EL HODE MATERNO INFANTIL LA PAZ

Estado: El monto referencial es de bs.21.000.000,00 el cual tiene la Resolución de Adjudicación de fecha 20/10/2022 (anexo 12) con un monto de bs. 20,000,000,00 para la adquisición del equipamiento, ya se firmo el contrato n° ALC/067/2022 .

la empresa COSIN LTDA. solicito la aprobación del plano propuesto en cumplimiento al contrato mediante CITE DIV MED 68/2022 de fecha 26/10/2022.

La unidad solicitante y la comisión de recepción serán las encargadas de llevar el proceso de adquisición del equipo.

La solicitud de aprobación del plano se lo realizara conjuntamente con la unidad solicitante para el cual debe realizarse el análisis y coordinarse para emitir una respuesta.

MONTO DEL PROYECTO ADJUDICADO

Bs. 20.000.000,00

3, EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA PEDIATRICA EN EL HODE MATERNO INFANTIL LA PAZ

3.2.

REFUNCIONALIZACION DE LA UNIDAD DE HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA PEDIATRICA HODE MATERNO INFANTIL LA PAZ

SUPERVISION REFUNCIONALIZACION DE LA UNIDAD DE HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA PEDIATRICA HODE MATERNO INFANTIL LA PAZ

Estado: EL monto referencial de los trabajos complementarios en infraestructura es de Bs.1.000.000,00, una vez firmado el contrato de la instalación del equipo de hemodinamia se coordinara con la empresa adjudicada y la unidad solicitante para realizar los trabajos complementarios.

MONTO DEL PROYECTO

Bs. 1.000.000,00

3. IMPLM. DEL AREA DE TRASPLANTE DE MEDULA OSEA EN EL HODE MATERNO INFANTIL LA PAZ

3.3.

REFUNCIONALIZACION AREA TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS HODE MATERNO INFANTIL
SUPERVISION REFUNCIONALIZACION AREA TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS HODE MATERNO INFANTIL

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PAGOS REALIZADOS	SALDOS POR PAGAR
17,69%	50,00%	OBRA: BS. 480.480,94	OBRA: BS. 519.267,45
		SUP: BS. 10.813,83	SUP: BS. 34.186,17

ESTADO: Se encuentra en ejecución, se hicieron modificaciones al proyecto debido a la magnitud de los equipos motivo por el cual la empresa esta realizando el contrato modificadorio N°1.



2. IMPLM. DEL AREA DE TRASPLANTE DE MEDULA OSEA EN EL HODE MATERNO INFANTIL LA PAZ

3.4.

IMPLEMENTACION CIRCUITO DE AIRE Y GASES MEDICOS AREA DE TRASPLANTE HODE MATERNO INFANTIL

SUPERVISION IMPLEMENTACION CIRCUITO DE AIRE Y GASES MEDICOS AREA DE TRASPLANTE HODE MATERNO INFANTIL

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PAGOS REALIZADOS	SALDOS POR PAGAR
11,40%	30,00 %	OBRA: BS. 53.367,36 SUP: BS. 2.869,35	OBRA: BS. 416.594,16 SUP: BS. 20.630,65

ESTADO: Se hicieron modificaciones al proyecto debido a la magnitud de los equipos que ingresaran al ambiente, motivo por el cual la empresa esta realizando balance correspondiente para el contrato modificatorio N°1.



IMPLEM. DEL AREA DE TRASPLANTE DE MEDULA OSEA EN EL HODE MATERNO INFANTIL LA PAZ

3.5.

EQUIPO DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA HODE MATERNO INFANTIL LA PAZ

Estado: NO SE TIENE INFORMACION DEL EQUIPO

MONTO DEL PROYECTO

Bs.

4. AMPLIACION REMODELACION Y REFUNCIONALIZACION DEL HAIG OBRERO N°1 - LA PAZ

4.1.

ESTUDIO PARA LA AMPLIACION REMODELACION Y REFUNCIONALIZACION DEL HAIG OBRERO N°1 - LA PAZ

SE RECEPCIONO LA NOTA 054-2022 EN FECHA 11/10/2022 EN LA CUAL SOLICITAN INFORME TECNICO ESPECIFICANDO LA SOLICITUD DE CONTRATACION, OBJETO DE LA CONTRATACION Y PRECIOS REFERENCIALES PARA EL ESTUDIO DE PRE-INVERSION Y EJECUCION DE LA OBRA.

SE EMITIO LA RESPUESTA MEDIANTE EL INFORME TECNICO 488/2022 AL ADMINISTRADOR REGIONAL LA PAZ EN FECHA 19/10/2022 (ANEXO 13).

MONTO DEL PROYECTO

Bs. 1.305.426,39

5. IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DEL ADULTO MAYOR Y SALUD MENTAL

4.1.

ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DEL ADULTO MAYOR DE AUQUISAMAÑA LA PAZ

EN FECHA 14 DE OCTUBRE SE REALIZO LA REMISION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DEL ADULTO MAYOR Y SALUD MENTAL DE AUQUISAMAÑA LA PAZ MEDIANTE NOTA CON CITE 1492/2022 (ANEXO 14) PARA SU REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - A LA FECHA CONTINUA EN REVISION POR PARTE DEL FISCAL DESIGNADO

6. CONST. 2 BLOQUES - ALMACENAMIENTO MED. E INSUMOS - LPZ

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PAGOS REALIZADOS	SALDOS POR PAGAR
91,86%	100,00 %	OBRA: BS. 38.418.635,71 SUP: BS. 1.401.714,08	OBRA: BS. 3.279.635,71 SUP: BS. 247.361,31

ESTADO: YA VA MAS DE UN AÑO QUE NO SE SOLICITA EL PAGO NI TAMPOCO SE CIERRA ESTE PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%



7. AMPL. CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN INFANTIL C.I.R.I. - LA PAZ

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PAGOS REALIZADOS	SALDOS POR PAGAR
43,85%		OBRA: BS. 12.896.135,21 SUP: BS. 416.575.523,00	OBRA: BS. 16.513.523,20 SUP: BS. 533.425,00
ESTADO: SE CORRESPONDIENTE.		ARA EL	SEGUIMIENTO



8. CONST. CENTRO DE MEDICINA INTEGRAL ZONA SUR LA PAZ

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PAGOS REALIZADOS	SALDOS POR PAGAR
29,19%		OBRA: BS. 4.417.050,03 SUP: BS. 196.066,50	OBRA: BS. 10.717.050,03 SUP: BS. 475.625,50

ESTADO: EL TRAMITE DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN SE REMITIRA AL NACIONAL.



9. CONST. CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA FAMILIAR VILLA FATIMA LA PAZ

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PAGOS REALIZADOS	SALDOS POR PAGAR
0,40%	1,31%	OBRA: BS. 127.760,12 SUP: BS. 0	OBRA: BS. 30.777.524,46 SUP: BS. 1.390.737,81

ESTADO: LA PLANILLA N°1 DE SUPERVISIÓN, NO SE TIENE INFORMACION DE SOLICITUD DE PAGOS POR PARTE DEL D.N.I.S.

